Bewonersbrief **wegwerkzaamheden**

Betreft:
Reconstructie Stampstraat te Simpelveld

Heerlen, 14 februari 2025

Geachte bewoners/belanghebbenden,

WIJZIGING START WERKZAAMHEDEN

Volgens eerdere berichten zouden de werkzaamheden in de Stampstraat starten op maandag 17 februari a.s. Helaas door onvoorziene omstandigheden is er stagnatie opgetreden bij de werkzaamheden aan de Nijswillerweg.
Hierdoor schuift de start van de werkzaamheden aan de Stampstraat helaas door en starten na de carnaval.

Wanneer gaan we starten?
Op maandag **10 maart** as. starten wij met de werkzaamheden in **FASE 1A.**
De bestaande verharding van de rijbaan wordt verwijderd. Vervolgens wordt er een nieuw riool gelegd voor regenwater en worden de huis- en kolkaansluitingen vernieuwd. Aansluitend wordt de weg opnieuw ingericht met nieuwe verharding.

Vooropname en grondonderzoek
Komende week worden de vooropnames uitgevoerd door expertise bureau Vermeer, hierover bent u reeds geïnformeerd. Daarmee blijft de geplande datum bij u voor deze opnames uit te voeren gewoon staan.
Ook vindt er komende week grondonderzoek plaats in de Stampstraat, doorgaand verkeer blijft mogelijk.

Wanneer vinden de werkzaamheden plaats?
Als gevolg van de gewijzigde startdatum hebben wij de planning bijgesteld:

Fase	Werkvak	Van	Tot	Duur
Fase 1A	St. Remigiusstraat – Hennebergstraat	10 maart	11 april	5 weken
Fase 1B	Hennebergstraat – Houbiersstraat	7 april	9 mei	5 weken
Fase 2	Dr. Ottenstraat – St. Remigiusstraat	22 april	18 juli	13 weken

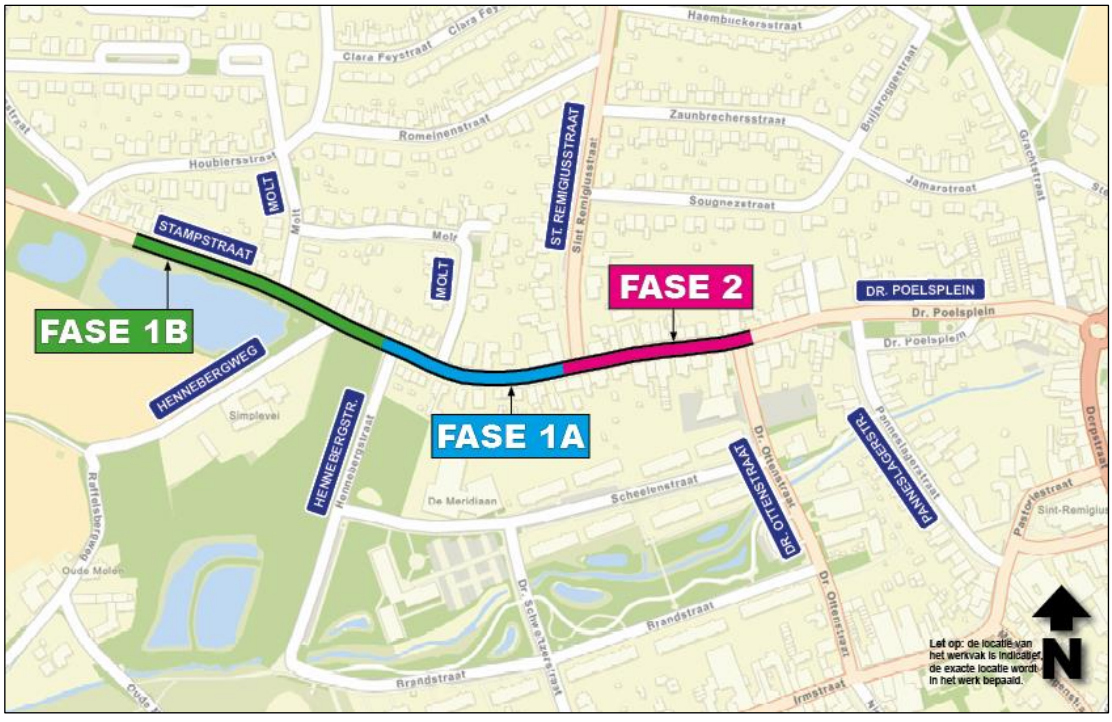

Bewonersbrief **wegwerkzaamheden**

Afbeelding: fasering

Nadere informatie
We vertrouwen erop u met deze publicatie voldoende geïnformeerd te hebben. Heeft u toch nog vragen of meer informatie nodig? Neem dan contact op met een van onderstaande contactpersonen:

Rick Vrancken, uitvoerder namens Kurvers Wegenbouw: ☎ 045-5751155
Ben Schols, omgevingsmanager namens Kurvers Wegenbouw ☎ 06-15681552

Wij vertrouwen op uw begrip en wensen u een fijne ***vasteloavend***.

Met vriendelijke groeten,
Het uitvoeringsteam

GEBRS. KURVERS BV
WEGENBOUW / RECYCLING / TRANSPORT
